PMR Public Report

Operation Number	ES-L1152	**Chief of Operations Validation Date**	10/10/24
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2024	**Division Chief Validation Date**	
Last Update	10/07/24	**Country Representative Validation Date**	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Strengthen the Water and Sanitation Sector in El Salvador	**Loan Number**	5577/OC-ES
Executing Agency	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS ANDA	**Sector/Subsector**	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
Team Leader	ESTRADA REGALADO, NELSON MAURICIO	**Overall Stage**	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	**Country**	El Salvador
Lending Instrument	Investment Loan	**Convergence related Operation(s)**	
Borrower	REPUBLICA DE EL SALVADOR		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	**Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?**	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	**Date of approval**	
Safeguard Performance Rating - Rationale	La Operación se preparó bajo el cumplimiento del nuevo Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) y cuenta con un Análisis Ambiental y Social (AAS) y un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), consulta pública y un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y además se está avanzando satisfactoriamente en el cumplimiento de los requerimientos contractuales.		

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US$)			
Operations	**Original IDB**	**Current IDB**	**Local Counterpart**	**Co-Financing / Country**	**Total Original Cost**	**Current IDB**	**Disb. Amount to Date**	**% Disbursed**	**Undisbursed Amount**
ES-L1152	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	2,325,000	2.33%	97,675,000
Aggregated	**100,000,000**	**100,000,000**	**0**	**0**	**100,000,000**	**100,000,000**	**2,325,000**	**2.33%**	**97,675,000**

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

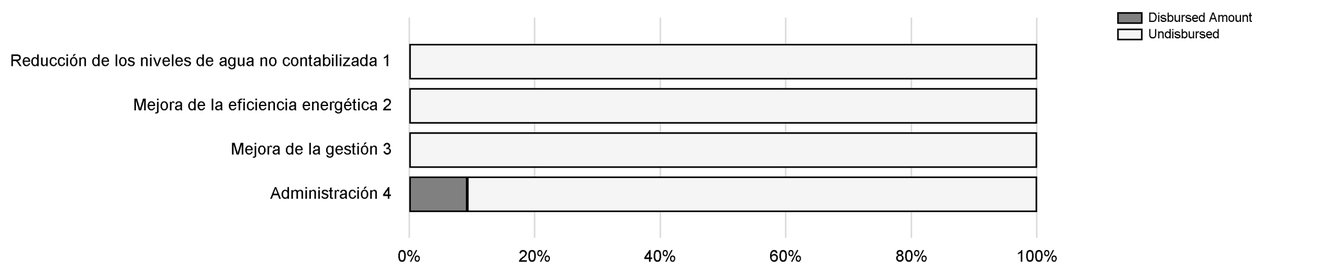

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la continuidad de los servicios de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.0	Hogares con acceso a agua potable por lo menos de 12 horas al día 7 días a la semana en el área de intervención del Programa	Número de Hogares	0	2022	P	-	-	-	-	120,000	120,000
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe de la Gerencia Comercial y Técnica de ANDA

Observations: Servicio mejorado se refiere a una continuidad de12 horas al día, 7 días a la semana, cumpliendo con los estandades de calidad nacionales.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Reducir los niveles de Agua no Contabilizada (ANC) en el Área Metropolitana de San Salvador

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
2.0	Índice de Agua No Contabilizada (ANC) en el área de intervención del Programa	Índice (base=100)	100	2022	P	-	-	-	-	90	90
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Boletín estadístico anual de ANDA

Observations: Índice de Pérdidas de Distribución = 1 - (Volumen facturado de la Zona de Intervención/Volumen producido de la Zona de Intervención). Comentario: El número índice igual a 100 corresponde al valor pre-programa que será medido con la instalación de los macromedidores, que se espera para el tercer anio de operación. Para la evaluación al cierre, los valores serán reemplazados por los valores observados. La meta refleja una reducción de 10% respecto a la línea de base.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Mejorar la eficiencia energética de los sistemas de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
3.0	Consumo de energía por metro cúbico agua producido en el área de intervención del Programa	kWh/m3	2.8	2022	P	-	-	-	-	2.7	2.7
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Boletín estadístico anual de ANDA.

Observations: Consumo anual de energía Zona de intervención /volumen de agua producida Zona de intervención.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 4: Mejorar la gestión empresarial de ANDA

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
4.0	Margen operativo (Ingresos operativos (tarifas) anuales / costos operativos anuales) en el área de Intervención del Programa	Porcentaje	71	2022	P	-	-	-	-	90	90
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe de la Gerencia Comercial y financiera

Observations: Informes de estados financieros auditados de ANDA

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
4.3	Proyectos de inversión de AyS priorizados por ANDA en la zona de intervención del programa que siguen las directrices del Plan Maestro de AyS	Porcentaje	0	2022	P	-	-	-	-	100	100
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe de proyectos del sistema de inversión pública del Ministerio de Hacienda

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
4.4	Procesos de ANDA automatizados e integrados (Financiero, Comercial, RRHH y Compras)	Número de procesos	0	2022	P	-	-	-	-	4	4
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Reportes integrados del sistema ERP

Observations: Es un ERP con los modulos para los procesos financiero, commercial, RRHH y compras integrados.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
4.4	Número de analisis de calidad de agua realizados en los laboratorios construidos y/o equipados	Número de análisis	893	2022	P	-	-	-	-	2,333	2,333
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe de laboratorio de calidad de agua.

Observations: La meta es anual y se ha programado al final ya que se requiere la construcción y el equipamiento del laboratorio.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
4.5	Mujeres empleadas en ANDA	Porcentaje	21.8	2022	P	-	-	-	-	25	25
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Boletín estadístico anual de ANDA

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Reducción de los niveles de agua no contabilizada

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2024	EOP 2027	2024	EOP 2027
1.01	Sectores de la red de distribución intervenidos	Sectores	P	1	2	5,332,886	16,842,545
			P (a)	-	2	-	16,842,545
			A	-	-	-	-
1.02	Sistema Scada de monitoreo y control de la Zona Norte implementado	Sistema	P	-	1	40,000	1,500,000
			P (a)	-	1	-	1,500,000
			A	-	-	-	-
1.03	Equipos de prueba para macromedidores y micromedidores adquiridos	equipos	P	2	2	870,000	870,000
			P (a)	2	2	870,000	870,000
			A	-	-	-	-
1.04	Macromedidores y micromedidores comerciales adquiridos e instalados en el área de Intervención del Programa	medidores	P	40,000	120,000	3,462,267	9,231,607
			P (a)	-	120,000	-	9,231,607
			A	-	-	-	-
1.05	Macromedidores adquiridos e instalados en el área de producción del Programa	Macromedidor	P	-	50	36,000	4,883,700
			P (a)	-	50	36,000	4,883,700
			A	-	-	-	-
1.06	Equipos para reducción de Agua No Contabilizada adquiridos	equipos	P	119	119	472,500	472,500
			P (a)	119	119	472,500	472,500
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Mejora de la eficiencia energética

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	**Unit of Measure**		**2024**	**EOP 2027**	**2024**	**EOP 2027**
2.01	Diseño civil e hidráulico del sistema Zona Norte elaborado	Diseño	P	-	1	56,000	702,234
			P (a)	-	1	56,000	702,234
			A	-	-	-	-
2.02	Sistema de alimentación eléctrica del sistema Zona Norte mejorado	Sistema	P	-	1	1,578,269	6,256,647
			P (a)	-	1	-	6,256,647
			A	-	-	-	-
2.03	Estaciones de Bombeo del sistema Zona Norte mejoradas	Estaciones	P	-	11	479,000	4,673,333
			P (a)	-	11	-	4,673,333
			A	-	-	-	-
2.04	Pozos de Zona Norte perforados o rehabilitados	Pozos	P	12	26	2,843,434	3,521,500
			P (a)	12	26	2,843,434	3,521,500
			A	1	1	320,372.4	320,372.4
2.05	Equipo para limpieza de pozos adquirida	Equipo	P	1	1	600,000	600,000
			P (a)	1	1	600,000	600,000
			A	-	-	-	-
2.06	Líneas de conducción hidráulicas del sistema Zona Norte acondicionadas	km	P	-	4.7	50,000	12,997,326
			P (a)	-	4.7	-	12,997,326
			A	-	-	-	-
2.07	Estaciones de Rebombeo del sistema Zona Norte mejoradas	Estación	P	-	3	103,200	24,798,374
			P (a)	-	3	-	24,798,374
			A	-	-	14,000	14,000

Component Nbr. 3 Mejora de la gestión

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2024	EOP 2027	2024	EOP 2027
3.01	Plan de Acción de Gobierno Corporativo actualizado e implementado	Plan	P	-	1	60,000	300,000
			P (a)	-	1	60,000	300,000
			A	-	-	-	-
3.02	Plan de Modernización Tecnológica de ANDA diseñado e implementado	Plan	P	-	1	600,000	4,200,000
			P (a)	-	1	-	4,200,000
			A	-	-	-	-
3.03	Plan Maestro de Agua y Saneamiento para el AMSS desarrollado y divulgado	Plan	P	-	1	-	1,800,000
			P (a)	-	1	-	1,800,000
			A	-	-	-	-
3.04	Programa de Planificación Estratégica y Financiera de ANDA desarrollado e implementado	Programa	P	-	1	70,000	1,400,000
			P (a)	-	1	-	1,400,000
			A	-	-	-	-
3.05	Plan de comunicación de ANDA diseñado e implementado	Plan	P	1	1	118,750	250,000
			P (a)	1	1	-	250,000
			A	-	-	-	-
3.06	Normas Técnicas de ANDA actualizadas	Norma	P	-	1	-	200,000
			P (a)	-	1	-	200,000
			A	-	-	-	-
3.07	Laboratorios de calidad de agua construido y/o equipados	Laboratorio	P	-	3	217,570	925,234
			P (a)	-	3	185,046	925,234
			A	-	-	-	-
3.08	Política institucional de género actualizada	Política	P	1	1	10,000	20,000
			P (a)	1	1	10,000	20,000
			A	1	1	4,000	4,000
3.09	Estrategia de inclusión laboral de personas con discapacidad en ANDA diseñada	Estrategia	P	1	1	13,000	20,000
			P (a)	1	1	13,000	20,000
			A	-	-	7,000	7,000
3.10	Equipamiento para la Unidad de Género adquiridos	Equipo	P	-	7	-	20,000
			P (a)	-	7	-	20,000
			A	6	6	10,242.32	10,242.32
3.11	Módulo de indicadores de género incorporado en el sistema informático de ANDA desarrollado	Módulo	P	1	1	15,000	15,000
			P (a)	1	1	15,000	15,000
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Administración	P	570,020	3,500,000
		P (a)	570,020	3,500,000
		A	335,358.99	465,358.99

Total Cost				
	Total Cost	P	17,597,896	100,000,000
		P (a)	5,731,000	100,000,000
		A	690,973.71	820,973.71

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
1	Active	Organizational Structure

Response Actions

	Management Strategy	Status
1.01	MITIGATE	ACTIVE
1.02	MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
2	Active	Technical Design

Response Actions

	Management Strategy	Status
2.01	MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
3	Active	Natural Environment

Response Actions

	Management Strategy	Status
3.01	MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
4	Active	Political Environment

Response Actions

	Management Strategy	Status
4.01	MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
5	Active	Goods, and Services

Response Actions

	Management Strategy	Status
5.01	MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
6	Active	Goods, and Services
	Response Actions	
	Management Strategy	**Status**
	6.01 MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
Project Management Capacity
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
