
PMR Public Report

Operation Number	ES-L1152	**Chief of Operations Validation Date**	10/08/25
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2025	**Division Chief Validation Date**	
Last Update	09/26/25	**Country Representative Validation Date**	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Program to Strengthen the Water and Sanitation Sector in El Salvador	**Loan Number**	5577/OC-ES
Executing Agency	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS ANDA	**Sector/Subsector**	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
Team Leader	ESTRADA REGALADO, NELSON MAURICIO	**Overall Stage**	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	**Country**	El Salvador
Lending Instrument	Investment Loan	**Convergence related Operation(s)**	
Borrower	REPUBLICA DE EL SALVADOR		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	**Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?**	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	**Date of approval**	
Safeguard Performance Rating - Rationale	La Operación no ha iniciado ejecución de trabajos físicos en el terreno; la misma se preparó bajo el cumplimiento del nuevo Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) y cuenta con un Análisis Ambiental y Social (AAS) y un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), consulta pública y un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y además se está avanzando satisfactoriamente en el cumplimiento de los requerimientos contractuales.		

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US$)			
Operations	**Original IDB**	**Current IDB**	**Local Counterpart**	**Co-Financing / Country**	**Total Original Cost**	**Current IDB**	**Disb. Amount to Date**	**% Disbursed**	**Undisbursed Amount**
ES-L1152	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	8,325,000	8.33%	91,675,000
Aggregated	**100,000,000**	**100,000,000**	**0**	**0**	**100,000,000**	**100,000,000**	**8,325,000**	**8.33%**	**91,675,000**

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

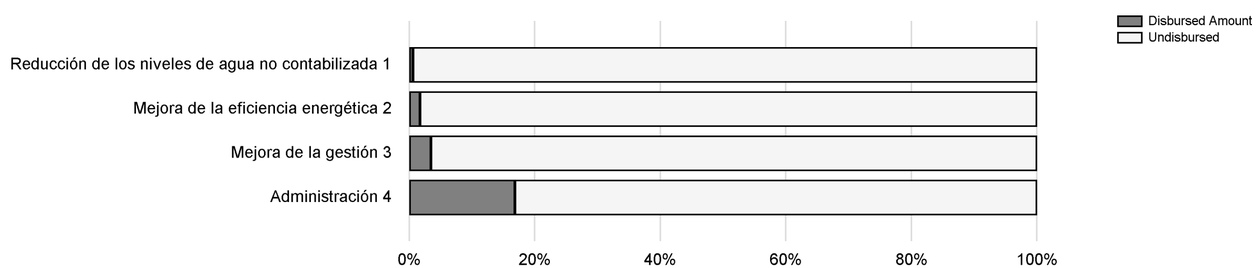

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la continuidad de los servicios de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.0	Hogares con acceso a agua potable por lo menos de 12 horas al día 7 días a la semana en el área de intervención del Programa	Número de Hogares	0	2022	P	-	-	-	-	120,000	120,000
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe de la Gerencia Comercial y Técnica de ANDA

Observations: Servicio mejorado se refiere a una continuidad de12 horas al día, 7 días a la semana, cumpliendo con los estandades de calidad nacionales.

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution								

Specific Development Objectives Nbr. 2: Reducir los niveles de Agua no Contabilizada (ANC) en el Área Metropolitana de San Salvador

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
2.0	Índice de Agua No Contabilizada (ANC) en el área de intervención del Programa	Índice (base=100)	100	2022	P	-	-	-	-	90	90
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Boletín estadístico anual de ANDA

Observations: Índice de Pérdidas de Distribución = 1 - (Volumen facturado de la Zona de Intervención/Volumen producido de la Zona de Intervención). Comentario: El número índice igual a 100 corresponde al valor pre-programa que será medido con la instalación de los macromedidores, que se espera para el tercer anio de operación. Para la evaluación al cierre, los valores serán reemplazados por los valores observados. La meta refleja una reducción de 10% respecto a la línea de base.

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution								

Specific Development Objectives Nbr. 3: Mejorar la eficiencia energética de los sistemas de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
3.0	Consumo de energía por metro cúbico agua producido en el área de intervención del Programa	kWh/m3	2.8	2022	P	-	-	-	-	2.7	2.7
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Boletín estadístico anual de ANDA.

Observations: Consumo anual de energía Zona de intervención /volumen de agua producida Zona de intervención.

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution								

Specific Development Objectives Nbr. 4: Mejorar la gestión empresarial de ANDA

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
4.0	Margen operativo (Ingresos operativos (tarifas) anuales / costos operativos anuales) en el área de Intervención del Programa	Porcentaje	71	2022	P	-	-	-	-	90	90
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe de la Gerencia Comercial y financiera

Observations: Informes de estados financieros auditados de ANDA

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
4.3	Proyectos de inversión de AyS priorizados por ANDA en la zona de intervención del programa que siguen las directrices del Plan Maestro de AyS	Porcentaje	0	2022	P	-	-	-	-	100	100
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe de proyectos del sistema de inversión pública del Ministerio de Hacienda

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
4.4	Procesos de ANDA automatizados e integrados (Financiero, Comercial, RRHH y Compras)	Número de procesos	0	2022	P	-	-	-	-	4	4
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Reportes integrados del sistema ERP

Observations: Es un ERP con los modulos para los procesos financiero, commercial, RRHH y compras integrados.

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
4.4	Número de analisis de calidad de agua realizados en los laboratorios construidos y/o equipados	Número de análisis	893	2022	P	-	-	-	-	2,333	2,333
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe de laboratorio de calidad de agua.

Observations: La meta es anual y se ha programado al final ya que se requiere la construcción y el equipamiento del laboratorio.

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
4.5	Mujeres empleadas en ANDA	Porcentaje	21.8	2022	P	-	-	-	-	25	25
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Boletín estadístico anual de ANDA

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	Yes	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No
IF Contribution									

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Reducción de los niveles de agua no contabilizada

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2025	EOP 2027	2025	EOP 2027
1.01	Sectores de la red de distribución intervenidos	Sectores	P	-	2	6,576,948	16,842,545
			P (a)	1	2	4,182,927.08	16,842,545
			A	-	-	183,344.91	343,844.91
1.02	Sistema Scada de monitoreo y control de la Zona Norte implementado	Sistema	P	-	1	438,000	1,500,000
			P (a)	-	1	219,000	1,500,000
			A	-	-	-	40,000
1.03	Equipos de prueba para macromedidores y micromedidores adquiridos	Equipos	P	-	2	-	870,000
			P (a)	2	2	870,000	870,000
			A	-	-	-	-
1.04	Macromedidores y micromedidores comerciales adquiridos e instalados en el área de Intervención del Programa	Medidores	P	40,000	120,000	2,884,670	9,231,607
			P (a)	21,000	120,000	2,381,924.44	9,231,607
			A	-	-	-	-
1.05	Macromedidores adquiridos e instalados en el área de producción del Programa	Macromedidor	P	25	50	1,690,350	4,883,700
			P (a)	-	50	36,272.73	4,883,700
			A	-	-	15,000	36,000
1.06	Equipos para reducción de Agua No Contabilizada adquiridos	Equipos	P	-	119	-	472,500
			P (a)	64	119	173,936.18	472,500
			A	50	105	15,713.88	314,277.7

Component Nbr. 2 Mejora de la eficiencia energética

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	**Unit of Measure**		**2025**	**EOP 2027**	**2025**	**EOP 2027**
2.01	Diseño civil e hidráulico del sistema Zona Norte elaborado	Diseño	P	-	1	417,286	702,234
			P (a)	-	1	280,893.6	702,234
			A	-	-	-	-
2.02	Sistema de alimentación eléctrica del sistema Zona Norte mejorado	Sistema	P	-	1	177,179	6,256,647
			P (a)	-	1	836,588.08	6,256,647
			A	-	-	-	-
2.03	Estaciones de Bombeo del sistema Zona Norte mejoradas	Estaciones	P	3	11	2,592,100	4,673,333
			P (a)	-	11	63,800	4,673,333
			A	-	-	22,500	50,000
2.04	Pozos de Zona Norte perforados o rehabilitados	Pozos	P	14	26	289,786	3,521,500
			P (a)	11	26	3,024,559.68	4,403,474.47
			A	5	20	524,782.98	1,903,697.77
2.05	Equipo para limpieza de pozos adquirida	Equipo	P	-	1	-	600,000
			P (a)	-	1	200,000	600,000
			A	-	-	-	-
2.06	Líneas de conducción hidráulicas del sistema Zona Norte acondicionadas	km	P	2	4.7	792,870	12,997,326
			P (a)	-	4.7	-	12,115,351.53
			A	-	-	-	-
2.07	Estaciones de Rebombeo del sistema Zona Norte mejoradas	Estación	P	-	3	123,200	24,798,374
			P (a)	-	3	54,000	24,798,374
			A	-	-	15,000	42,480

Component Nbr. 3 Mejora de la gestión

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2025	EOP 2027	2025	EOP 2027
3.01	Plan de Acción de Gobierno Corporativo actualizado e implementado	Plan	P	1	1	240,000	300,000
			P (a)	-	1	-	300,000
			A	-	-	-	-
3.02	Plan de Modernización Tecnológica de ANDA diseñado e implementado	Plan	P	-	1	2,000,000	4,200,000
			P (a)	-	1	840,000	4,200,000
			A	-	-	-	-
3.03	Plan Maestro de Agua y Saneamiento para el AMSS desarrollado y divulgado	Plan	P	-	1	845,000	1,800,000
			P (a)	-	1	360,000	1,800,000
			A	-	-	-	-
3.04	Programa de Planificación Estratégica y Financiera de ANDA desarrollado e implementado	Programa	P	-	1	465,500	1,400,000
			P (a)	-	1	-	693,602.23
			A	-	-	-	-
3.05	Plan de comunicación de ANDA diseñado e implementado	Plan	P	-	1	43,750	250,000
			P (a)	-	1	75,000	250,000
			A	-	-	-	-
3.06	Normas Técnicas de ANDA actualizadas	Norma	P	1	1	200,000	200,000
			P (a)	-	1	60,000	200,000
			A	-	-	-	-
3.07	Laboratorios de calidad de agua construido y/o equipados	Laboratorio	P	3	3	707,664	925,234
			P (a)	3	3	1,375,271.56	1,640,789.45
			A	-	-	13,500	279,017.89
3.08	Política institucional de género actualizada	Política	P	-	1	-	20,000
			P (a)	-	1	-	20,000
			A	-	1	-	20,000
3.09	Estrategia de inclusión laboral de personas con discapacidad en ANDA diseñada	Estrategia	P	-	1	-	20,000
			P (a)	-	1	-	20,000
			A	-	1	-	20,000
3.10	Equipamiento para la Unidad de Género adquiridos	Equipo	P	-	7	-	20,000
			P (a)	1	7	600	10,842.32
			A	-	6	-	10,242.32
3.11	Módulo de indicadores de género incorporado en el sistema informático de ANDA desarrollado	Módulo	P	-	1	-	15,000
			P (a)	-	1	5,000	15,000
			A	-	1	-	-

Other Cost				
	Administración	P	792,180	3,500,000
		P (a)	656,346.8	3,500,000
		A	145,986.35	753,295.36

Total Cost				
	Total Cost	P	21,276,483	100,000,000
		P (a)	15,696,120.15	100,000,000
		A	935,828.12	3,812,855.95

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
1	Active	Organizational Structure

Response Actions

	Management Strategy	Status
1.01	MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
2	Active	Technical Design

Response Actions

	Management Strategy	Status
2.01	MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
3	Active	Natural Environment

Response Actions

	Management Strategy	Status
3.01	AVOID	COMPLETE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
4	Materialized	Political Environment

Response Actions

	Management Strategy	Status
4.01	MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
5	Inactive	Goods, and Services

Response Actions

	Management Strategy	Status
5.01	MITIGATE	COMPLETE
5.02	AVOID	COMPLETE
5.03	MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
6	Materialized	Goods, and Services
	Response Actions	
	6.01	**Management Strategy**	**Status**
		AVOID	COMPLETE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
7	Active	Goods, and Services
	Response Actions	
	7.01	**Management Strategy**	**Status**
		AVOID	COMPLETE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
Others - Technical-Sectorial Dimensions
