
# PMR Public Report

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operation Number** | ES-L1152 | **Chief of Operations Validation Date** | 04/02/25 |
| **Year- PMR Cycle** | Second period Jan-Dec 2024 | **Division Chief Validation Date** | 04/04/25 |
| **Last Update** | 03/28/25 | **Country Representative Validation Date** | 04/28/25 |
| **PMR Validation Stage** | Validated by Representative | | |
| **Basic Data** | | | |
| **Operation Profile** | | | |
| **Operation Name** | Program to Strengthen the Water and Sanitation Sector in El Salvador | **Loan Number** | 5577/OC-ES |
| **Executing Agency** | ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS ANDA | **Sector/Subsector** | WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN |
| **Team Leader** | ESTRADA REGALADO, NELSON MAURICIO | **Overall Stage** | Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed) |
| **Operation Type** | Loan Operation | **Country** | El Salvador |
| **Lending Instrument** | Investment Loan | **Convergence related Operation(s)** | |
| **Borrower** | REPUBLICA DE EL SALVADOR | | |
| **Environmental and Social Safeguards** | | | |
| **Impacts Category** | B | **Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?** | NO |
| **Safeguard Performance Rating** | Satisfactory | **Date of approval** | |
| **Safeguard Performance Rating - Rationale** | La Operación no ha iniciado ejecución de trabajos físicos en el terreno; la misma se preparó bajo el cumplimiento del nuevo Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) y cuenta con un Análisis Ambiental y Social (AAS) y un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), consulta pública y un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y además se está avanzando satisfactoriamente en el cumplimiento de los requerimientos contractuales. | | |

**Financial Data**

| | Total Cost and Source | | | | | Available Funds (US$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Operations** | **Original IDB** | **Current IDB** | **Local Counterpart** | **Co-Financing / Country** | **Total Original Cost** | **Current IDB** | **Disb. Amount to Date** | **% Disbursed** | **Undisbursed Amount** |
| ES-L1152 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 8,325,000 | 8.33% | 91,675,000 |
| **Aggregated** | **100,000,000** | **100,000,000** | **0** | **0** | **100,000,000** | **100,000,000** | **8,325,000** | **8.33%** | **91,675,000** |

**Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)**

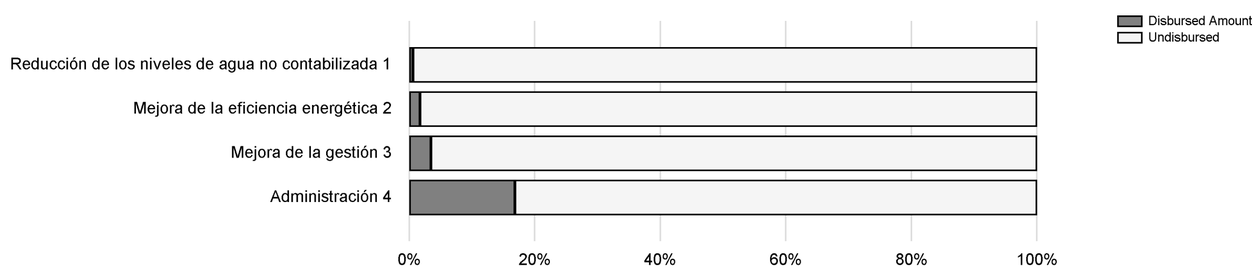


Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

**RESULTS MATRIX**

**General Development Objectives**

## RESULTS MATRIX

### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Mejorar la continuidad de los servicios de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador

**Observation:**

| | Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | EOP 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Hogares con acceso a agua potable por lo menos de 12 horas al día 7 días a la semana en el área de intervención del Programa | Número de Hogares | 0 | 2022 | P | - | - | - | - | 120,000 | 120,000 |
| | | | | | A | - | - | - | - | - | - |

**Details**

**Means of Verification:** Informe de la Gerencia Comercial y Técnica de ANDA

**Observations:** Servicio mejorado se refiere a una continuidad de12 horas al día, 7 días a la semana, cumpliendo con los estandades de calidad nacionales.

**Evaluation Methodology:** -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pro-Gender** | No | **Pro-Ethnicity** | No | CRF indicator | |
| | | | | | |

**Specific Development Objectives Nbr. 2:** Reducir los niveles de Agua no Contabilizada (ANC) en el Área Metropolitana de San Salvador

**Observation:**

| | Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | EOP 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Índice de Agua No Contabilizada (ANC) en el área de intervención del Programa | Índice (base=100) | 100 | 2022 | P | - | - | - | - | 90 | 90 |
| | | | | | A | - | - | - | - | - | - |

**Details**

**Means of Verification:** Boletín estadístico anual de ANDA

**Observations:** Índice de Pérdidas de Distribución = 1 - (Volumen facturado de la Zona de Intervención/Volumen producido de la Zona de Intervención). Comentario: El número índice igual a 100 corresponde al valor pre-programa que será medido con la instalación de los macromedidores, que se espera para el tercer anio de operación. Para la evaluación al cierre, los valores serán reemplazados por los valores observados. La meta refleja una reducción de 10% respecto a la línea de base.

**Evaluation Methodology:** -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pro-Gender** | No | **Pro-Ethnicity** | No | CRF indicator | |
| | | | | | |

**Specific Development Objectives Nbr. 3:** Mejorar la eficiencia energética de los sistemas de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador

**Observation:**

| | Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | EOP 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | Consumo de energía por metro cúbico agua producido en el área de intervención del Programa | kWh/m3 | 2.8 | 2022 | P | - | - | - | - | 2.7 | 2.7 |
| | | | | | A | - | - | - | - | - | - |

**Details**

**Means of Verification:** Boletín estadístico anual de ANDA.

**Observations:** Consumo anual de energía Zona de intervención /volumen de agua producida Zona de intervención.

**Evaluation Methodology:** -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pro-Gender** | No | **Pro-Ethnicity** | No | CRF indicator | |
| | | | | | |

**Specific Development Objectives Nbr. 4:** Mejorar la gestión empresarial de ANDA

**Observation:**

| | Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | EOP 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | Margen operativo (Ingresos operativos (tarifas) anuales / costos operativos anuales) en el área de Intervención del Programa | Porcentaje | 71 | 2022 | P | - | - | - | - | 90 | 90 |
| | | | | | A | - | - | - | - | - | - |

**Details**

**Means of Verification:** Informe de la Gerencia Comercial y financiera

**Observations:** Informes de estados financieros auditados de ANDA

**Evaluation Methodology:** -

| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | EOP 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | Proyectos de inversión de AyS priorizados por ANDA en la zona de intervención del programa que siguen las directrices del Plan Maestro de AyS | Porcentaje | 0 | 2022 | P | - | - | - | - | 100 | 100 |
| | | | | | A | - | - | - | - | - | - |

**Details**

**Means of Verification:** Informe de proyectos del sistema de inversión pública del Ministerio de Hacienda

**Observations:**

**Evaluation Methodology:** -

| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | EOP 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 | Procesos de ANDA automatizados e integrados (Financiero, Comercial, RRHH y Compras) | Número de procesos | 0 | 2022 | P | - | - | - | - | 4 | 4 |
| | | | | | A | - | - | - | - | - | - |

**Details**

**Means of Verification:** Reportes integrados del sistema ERP

**Observations:** Es un ERP con los modulos para los procesos financiero, commercial, RRHH y compras integrados.

**Evaluation Methodology:** -

| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | EOP 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 | Número de analisis de calidad de agua realizados en los laboratorios construidos y/o equipados | Número de análisis | 893 | 2022 | P | - | - | - | - | 2,333 | 2,333 |
| | | | | | A | - | - | - | - | - | - |

**Details**

**Means of Verification:** Informe de laboratorio de calidad de agua.

**Observations:** La meta es anual y se ha programado al final ya que se requiere la construcción y el equipamiento del laboratorio.

**Evaluation Methodology:** -

| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | EOP 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | Mujeres empleadas en ANDA | Porcentaje | 21.8 | 2022 | P | - | - | - | - | 25 | 25 |
| | | | | | A | - | - | - | - | - | - |

**Details**

**Means of Verification:** Boletín estadístico anual de ANDA

**Observations:**

**Evaluation Methodology:** -

| Pro-Gender | Yes | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

**Component Nbr. 1 Reducción de los niveles de agua no contabilizada**

| | | | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Output | Unit of Measure | | 2024 | EOP 2027 | 2024 | EOP 2027 |
| 1.01 | Sectores de la red de distribución intervenidos | Sectores | P | 1 | 2 | 5,332,886 | 16,842,545 |
| | | | P (a) | - | 2 | - | 16,842,545 |
| | | | A | - | - | 160,500 | 160,500 |
| 1.02 | Sistema Scada de monitoreo y control de la Zona Norte implementado | Sistema | P | - | 1 | 40,000 | 1,500,000 |
| | | | P (a) | - | 1 | - | 1,500,000 |
| | | | A | - | - | 40,000 | 40,000 |
| 1.03 | Equipos de prueba para macromedidores y micromedidores adquiridos | equipos | P | 2 | 2 | 870,000 | 870,000 |
| | | | P (a) | 2 | 2 | 870,000 | 870,000 |
| | | | A | - | - | - | - |
| 1.04 | Macromedidores y micromedidores comerciales adquiridos e instalados en el área de Intervención del Programa | medidores | P | 40,000 | 120,000 | 3,462,267 | 9,231,607 |
| | | | P (a) | - | 120,000 | - | 9,231,607 |
| | | | A | - | - | - | - |
| 1.05 | Macromedidores adquiridos e instalados en el área de producción del Programa | Macromedidor | P | - | 50 | 36,000 | 4,883,700 |
| | | | P (a) | - | 50 | 36,000 | 4,883,700 |
| | | | A | - | - | 21,000 | 21,000 |
| 1.06 | Equipos para reducción de Agua No Contabilizada adquiridos | equipos | P | 119 | 119 | 472,500 | 472,500 |
| | | | P (a) | 119 | 119 | 472,500 | 472,500 |
| | | | A | 55 | 55 | 298,563.82 | 298,563.82 |

**Component Nbr. 2 Mejora de la eficiencia energética**

| | | | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Output** | **Unit of Measure** | | **2024** | **EOP 2027** | **2024** | **EOP 2027** |
| 2.01 | Diseño civil e hidráulico del sistema Zona Norte elaborado | Diseño | P | - | 1 | 56,000 | 702,234 |
| | | | P (a) | - | 1 | 56,000 | 702,234 |
| | | | A | - | - | - | - |
| 2.02 | Sistema de alimentación eléctrica del sistema Zona Norte mejorado | Sistema | P | - | 1 | 1,578,269 | 6,256,647 |
| | | | P (a) | - | 1 | - | 6,256,647 |
| | | | A | - | - | - | - |
| 2.03 | Estaciones de Bombeo del sistema Zona Norte mejoradas | Estaciones | P | - | 11 | 479,000 | 4,673,333 |
| | | | P (a) | - | 11 | - | 4,673,333 |
| | | | A | - | - | 27,500 | 27,500 |
| 2.04 | Pozos de Zona Norte perforados o rehabilitados | Pozos | P | 12 | 26 | 2,843,434 | 3,521,500 |
| | | | P (a) | 12 | 26 | 2,843,434 | 4,403,474.47 |
| | | | A | 15 | 15 | 1,378,914.79 | 1,378,914.79 |
| 2.05 | Equipo para limpieza de pozos adquirida | Equipo | P | 1 | 1 | 600,000 | 600,000 |
| | | | P (a) | 1 | 1 | 600,000 | 600,000 |
| | | | A | - | - | - | - |
| 2.06 | Líneas de conducción hidráulicas del sistema Zona Norte acondicionadas | Km | P | - | 4.7 | 50,000 | 12,997,326 |
| | | | P (a) | - | 4.7 | - | 12,115,351.53 |
| | | | A | - | - | - | - |
| 2.07 | Estaciones de Rebombeo del sistema Zona Norte mejoradas | Estación | P | - | 3 | 103,200 | 24,798,374 |
| | | | P (a) | - | 3 | - | 24,798,374 |
| | | | A | - | - | 27,480 | 27,480 |

**Component Nbr. 3 Mejora de la gestión**

| | | | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Output | Unit of Measure | | 2024 | EOP 2027 | 2024 | EOP 2027 |
| 3.01 | Plan de Acción de Gobierno Corporativo actualizado e implementado | Plan | P | - | 1 | 60,000 | 300,000 |
| | | | P (a) | - | 1 | 60,000 | 300,000 |
| | | | A | - | - | - | - |
| 3.02 | Plan de Modernización Tecnológica de ANDA diseñado e implementado | Plan | P | - | 1 | 600,000 | 4,200,000 |
| | | | P (a) | - | 1 | - | 4,200,000 |
| | | | A | - | - | - | - |
| 3.03 | Plan Maestro de Agua y Saneamiento para el AMSS desarrollado y divulgado | Plan | P | - | 1 | - | 1,800,000 |
| | | | P (a) | - | 1 | - | 1,800,000 |
| | | | A | - | - | - | - |
| 3.04 | Programa de Planificación Estratégica y Financiera de ANDA desarrollado e implementado | Programa | P | - | 1 | 70,000 | 1,400,000 |
| | | | P (a) | - | 1 | - | 693,602.23 |
| | | | A | - | - | - | - |
| 3.05 | Plan de comunicación de ANDA diseñado e implementado | Plan | P | 1 | 1 | 118,750 | 250,000 |
| | | | P (a) | 1 | 1 | - | 250,000 |
| | | | A | - | - | - | - |
| 3.06 | Normas Técnicas de ANDA actualizadas | Norma | P | - | 1 | - | 200,000 |
| | | | P (a) | - | 1 | - | 200,000 |
| | | | A | - | - | - | - |
| 3.07 | Laboratorios de calidad de agua construido y/o equipados | Laboratorio | P | - | 3 | 217,570 | 925,234 |
| | | | P (a) | - | 3 | 185,046 | 1,640,789.45 |
| | | | A | - | - | 265,517.89 | 265,517.89 |
| 3.08 | Política institucional de género actualizada | Política | P | 1 | 1 | 10,000 | 20,000 |
| | | | P (a) | 1 | 1 | 10,000 | 20,000 |
| | | | A | 1 | 1 | 20,000 | 20,000 |
| 3.09 | Estrategia de inclusión laboral de personas con discapacidad en ANDA diseñada | Estrategia | P | 1 | 1 | 13,000 | 20,000 |
| | | | P (a) | 1 | 1 | 13,000 | 20,000 |
| | | | A | 1 | 1 | 20,000 | 20,000 |
| 3.10 | Equipamiento para la Unidad de Género adquiridos | Equipo | P | - | 7 | - | 20,000 |
| | | | P (a) | - | 7 | - | 10,842.32 |
| | | | A | 6 | 6 | 10,242.32 | 10,242.32 |
| 3.11 | Módulo de indicadores de género incorporado en el sistema informático de ANDA desarrollado | Módulo | P | 1 | 1 | 15,000 | 15,000 |
| | | | P (a) | 1 | 1 | 15,000 | 15,000 |
| | | | A | 1 | 1 | - | - |

| Other Cost | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Administración | P | 570,020 | 3,500,000 |
| | | P (a) | 570,020 | 3,500,000 |
| | | A | 477,309.01 | 607,309.01 |

| Total Cost | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Total Cost | P | 17,597,896 | 100,000,000 |
| | | P (a) | 5,731,000 | 100,000,000 |
| | | A | 2,747,027.83 | 2,877,027.83 |

## CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name | Type of Change | Sub type | Modified By | Entered in System |
|---|---|---|---|---|---|
| Output | Equipamiento para la Unidad de Género adquiridos | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | GABRIELAM | 3/3/2025 |
| | Laboratorios de calidad de agua construido y/o equipados | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | GABRIELAM | 3/13/2025 |
| | Líneas de conducción hidráulicas del sistema Zona Norte acondicionadas | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | GABRIELAM | 3/13/2025 |
| | Pozos de Zona Norte perforados o rehabilitados | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | GABRIELAM | 3/3/2025 |
| | Programa de Planificación Estratégica y Financiera de ANDA desarrollado e implementado | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | GABRIELAM | 3/13/2025 |

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

| Risk ID | Risk Status | Risk Taxonomy |
|---|---|---|
| 1 | Active | Organizational Structure |

**Response Actions**

| | Management Strategy | Status |
|---|---|---|
| 1.01 | MITIGATE | ACTIVE |

| Risk ID | Risk Status | Risk Taxonomy |
|---|---|---|
| 2 | Active | Technical Design |

**Response Actions**

| | Management Strategy | Status |
|---|---|---|
| 2.01 | MITIGATE | COMPLETE |

| Risk ID | Risk Status | Risk Taxonomy |
|---|---|---|
| 3 | Active | Natural Environment |

**Response Actions**

| | Management Strategy | Status |
|---|---|---|
| 3.01 | AVOID | ACTIVE |

| Risk ID | Risk Status | Risk Taxonomy |
|---|---|---|
| 4 | Active | Political Environment |

**Response Actions**

| | Management Strategy | Status |
|---|---|---|
| 4.01 | MITIGATE | COMPLETE |

| Risk ID | Risk Status | Risk Taxonomy |
|---|---|---|
| 5 | Active | Goods, and Services |

**Response Actions**

| | Management Strategy | Status |
|---|---|---|
| 5.01 | AVOID | ACTIVE |
| 5.02 | MITIGATE | ACTIVE |
| 5.03 | MITIGATE | ACTIVE |

| Risk ID | Risk Status | Risk Taxonomy |
|---|---|---|
| 6 | Active | Goods, and Services |
| | | |
| | **Response Actions** | |
| | 6.01 | **Management Strategy** | **Status** |
| | | AVOID | ACTIVE |
| | | | |
| | | | |

| Risk ID | Risk Status | Risk Taxonomy |
|---|---|---|
| 7 | Active | Goods, and Services |
| | | |
| | **Response Actions** | |
| | 7.01 | **Management Strategy** | **Status** |
| | | AVOID | ACTIVE |
| | | | |
| | | | |

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

| Lesson Learned - Categories |
| --- |
| Project Monitoring & Evaluation |
| Acquisitions and Procurement - Bidding Stage |
| Project Management Capacity |
| Legal aspects and public processes |
